

Keuringsverslag van een elektrische laagspanning- en zeer lage spanningsinstallatie

CONFORM

Datum keuring: 02/04/2026

Inspecteur: Michel Mergan

Mentor:

Installateur: IM electric

ID-label:

B.T.W. nr.:-

Klantreferentie:

Merk en type meettoestel: Metrel
Eurotest ET61557

Serienummer: 19481286

Datum verslag: 02/04/2026

Plaats van het onderzoek

Straatnaam Gérard Willemotlaan
Huisnummer 29
Busnummer
Postcode 9030
Gemeente Mariakerke
Land België

Eigenaar

Naam GB bv
Straatnaam Gérard Willemotlaan
Huisnummer 29
Busnummer
Postcode 9030
Gemeente Mariakerke
Land België

Installateur

Naam IM electric
BTW nr. -
Telefoonnummer
E-mail -

Type : woning

EAN : 54

☒ Niet meegedeeld

Teller Nr.: : 1SAG1100522402

Afbeelding schakel- en verdeelbord:



Aard onderzoek:

Gelijkvormigheidscontrole van een nieuwe huishoudelijke installatie volgens (KB 08/09/2019) - AREI Boek 1 - 6.4. en 4.2.4.3.

Is de installatie aangevat voor Ja
01/06/2023?

Netbeheerder: FLUVIUS

Spanning: 1~230V

Meter / bord verbinding: 10 mm²

Max beveiliging: 40 A

Aantal borden: 1

Aantal kringen: 16

Aardelektrode: Verticaal of schuin in de grond gedreven staven, pennen of geleiders

Ri algemeen: 8.09 MΩ

RE: 9.35 Ω

OK

OK



DIFFERENTIEELSTROOMINRICHTING

Δ (mA)	In (A)	In - andere (A)	I _t	Type	Beveiligde kringen	Test	x 2,5
300	40		22,5kA2s (3000A)	A	16	OK	OK
30	40	A-G	22,5kA2s (3000A)	A	7	OK	OK
30	40	H-O	22,5kA2s (3000A)	A	8	OK	OK

BESCHRIJVING INSTALLATIE

Aantal kringen	Curve	Bescherming IN (A)	(andere)	P	Sectie (mm²)
Zie schema	-	-	-	-	-
Visueel nazicht (algemeen)	OK	Directe aanraking	OK	Indirecte aanraking	OK
Aansluitingen	OK	schema in bijlage door Aceg vzw	NA		
Equipotentiale verbindingen	OK	Doorsnede geleiders	OK		
Continuïteit	OK	Verlichting / toestellen	NVT		

OPMERKINGEN - INBREUKEN - NOTA'S

N1 Dit verslag vervangt verslag met documentnummer:

N13 De ruimte die een bad en/of douche bevat (zoals bedoeld in hoofdstuk 7.1. van het AREI, Boek 1), was nog niet (volledig) afgewerkt. Wij konden ons bijgevolg niet uitspreken over de conformiteit van de elektrische installatie in deze ruimte. Een bijkomende gelijkvormigheidscontrole van deze installatie is nodig en dient aangevraagd te worden door de eigenaar, beheerder of uitbater na afwerking en vóór de ingebruikname van deze installatie.

N30 Het EAN-nummer kon ons niet meegedeeld worden tijdens onze rondgang.

N38 Toestellen niet geplaatst op moment van controle. Maximaal vermogen kon niet worden nagekeken ter bepaling van het gebruik van de kring (Boek 1 onderafdeling 5.2.1.2.)

N39 Delen van deze installatie dateren van na 1981, hierdoor zijn de uitzonderingen opgenomen in AREI boek 1 afdeling 8.2.2. ook van toepassing.

N4 De controle omvat enkel het woongedeelte van het pand.

N5 De verlichting is nog niet definitief geplaatst.

nota/note 27 Het EAN-nummer kon ons niet meegedeeld worden tijdens onze rondgang.

BESLUIT

- ☒ De elektrische installatie voldoet aan de voorschriften van het KB 08/09/2019 - AREI Boek 1. Het volgende controlebezoek is te voorzien voor 2/4/2051
- ☒ De nodige maatregelen werden genomen, zodat de ingangsklemmen van de automatische differentieelstroominrichting, geplaatst aan het begin van de installatie, ontoegankelijk zijn gemaakt door verzegeling.
- ☒ Het (de) eendraadsschema('s) en het (de) situatieplan(nen) werd(en) door het erkend organisme voor gezien getekend.

De installatie is aangevat voor 01/06/2023, hierdoor is rekening gehouden met de afwijkende beschikkingen vermeld in 6.5.8. van Boek I.

Deze pdf-versie van het keuringsverslag is de originele versie en mag worden verspreid..

Aantal bijlage(n): 13

VRIJGAVE VAN HET KEURINGSVERSLAG

Inspectietijd: van 14:52 tot 15:36

De inspecteur Michel Mergan



Mergan Michel - ACEG


Plichten van de eigenaar, beheerder, huurder voor de installatie onderworpen aan het AREI Boek 1 afdeling 9.1.2.
Het verslag dient te worden bewaard in het dossier van de elektrische installatie.
Elke wijziging dient te worden vermeld in het elektrisch dossier.
Elk ongeval overkomen van personen en te wijten, rechte­sreeks of onrecht­sreeks, aan de aanwezigheid van de elektrische installatie dient onmiddellijk meegedeeld te worden aan de algemene Directie Energie van de Federale Overheidsdienst Economie.


Kwaliteit
De reproductie van dit document is enkel toegelaten in zijn integrale vorm en enkel met het schriftelijk akkoord van het controleorganisme en de aanvrager.
De keuring beperkt zich tot de zichtbare en normaal toegankelijke delen van de installatie.

Stappenplan voor een installatie die conform is:


Stap 1	Stap 2	Stap 3	Stap 4
Lees dit proces-verbaal zorgvuldig en besteed aandacht aan de eventuele nota's	Als u grote wijzigingen of uitbreidingen aan de installatie aanbrengt, moet u deze laten controleren.	De volgende periodieke keuring is voorzien voor 2/4/2051	ACEG staat tot uw dienst voor alle noodzakelijke keuringen.



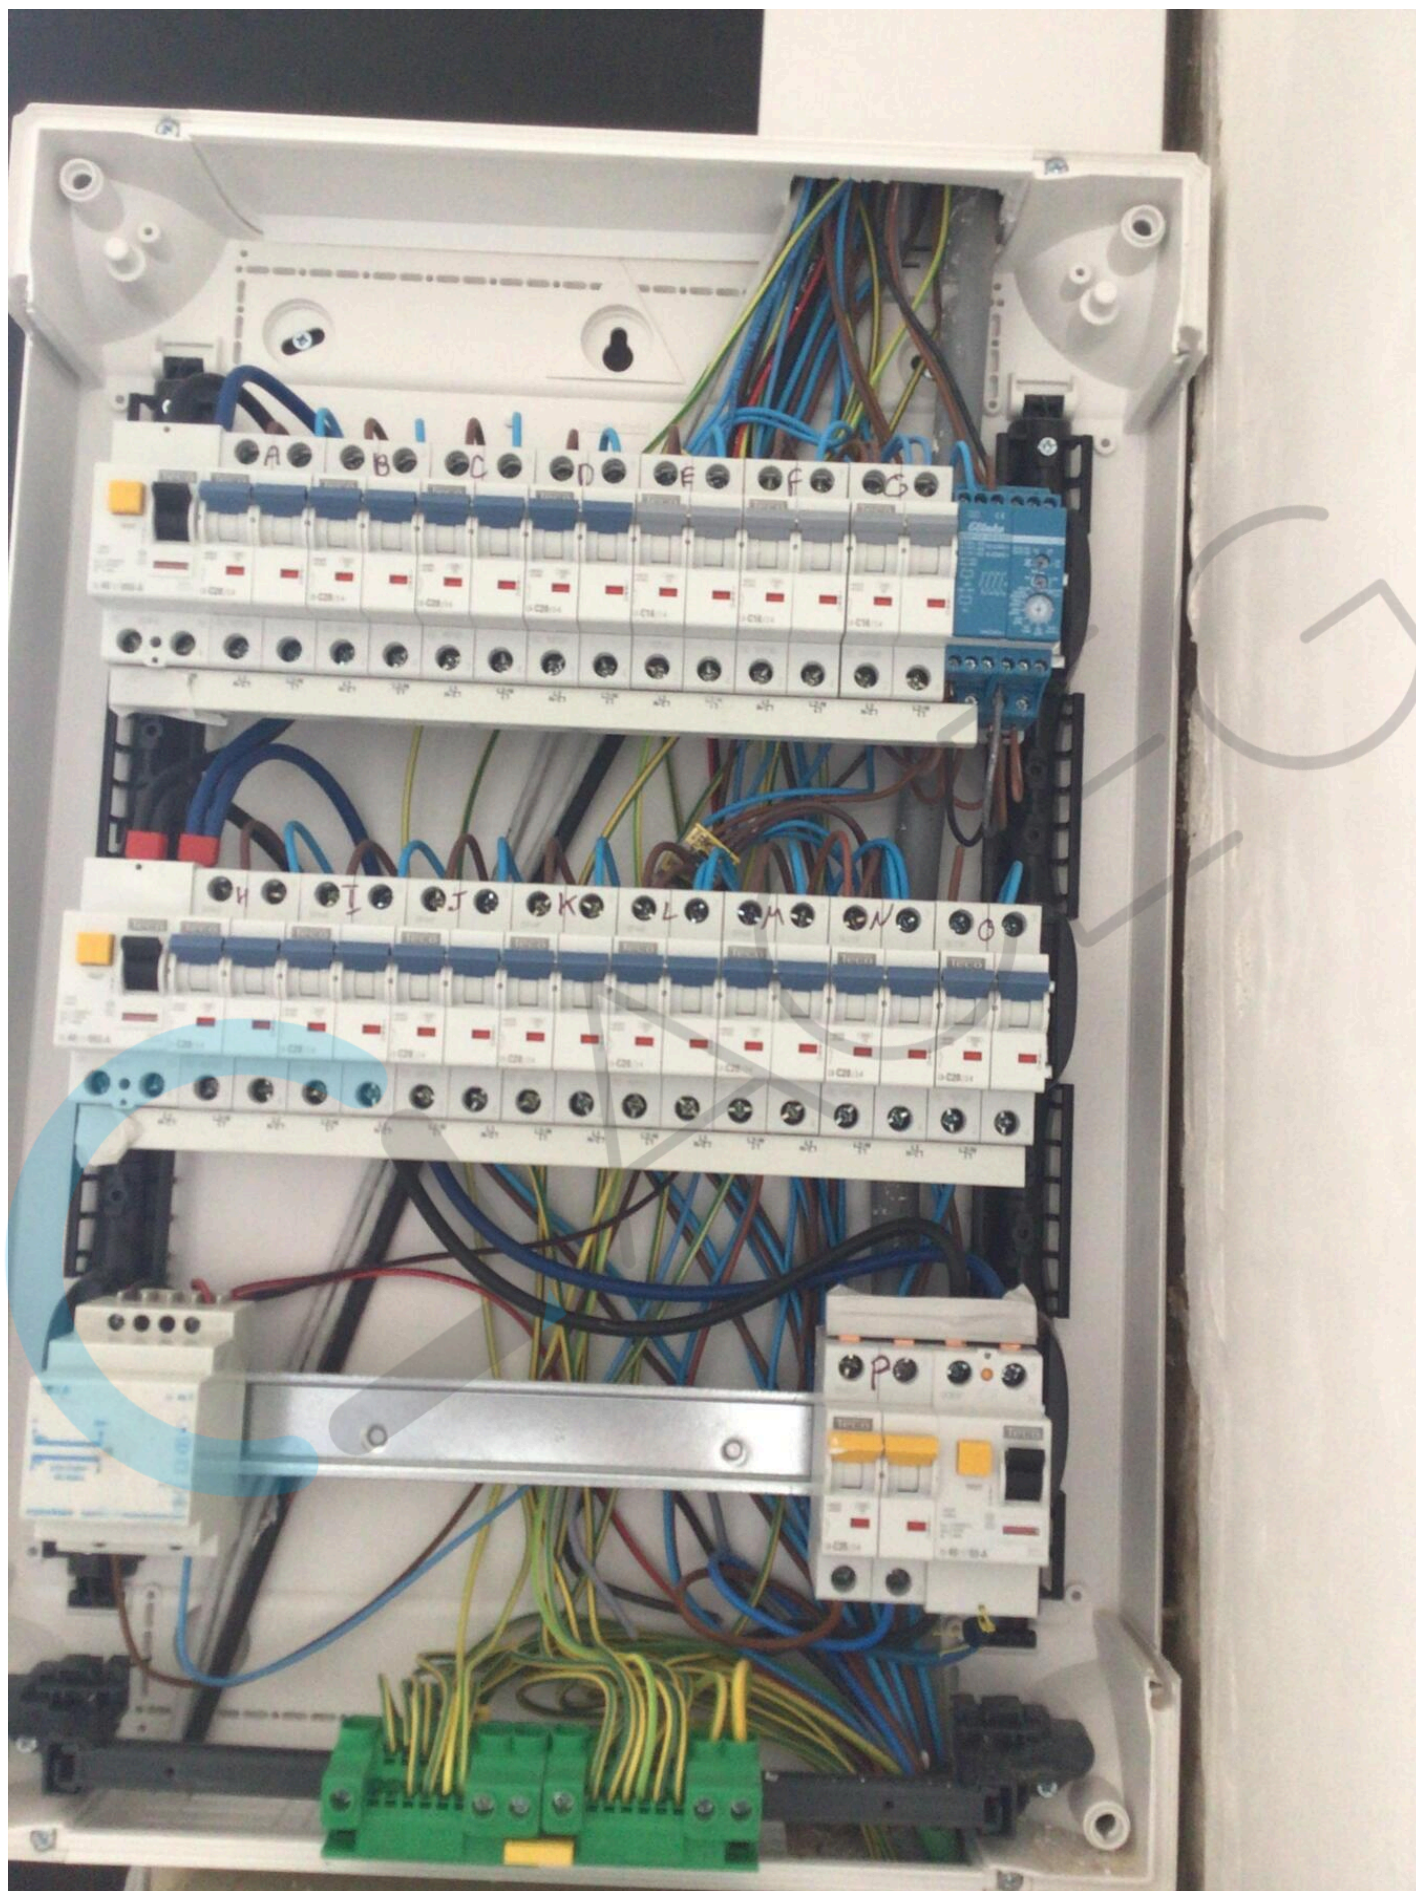

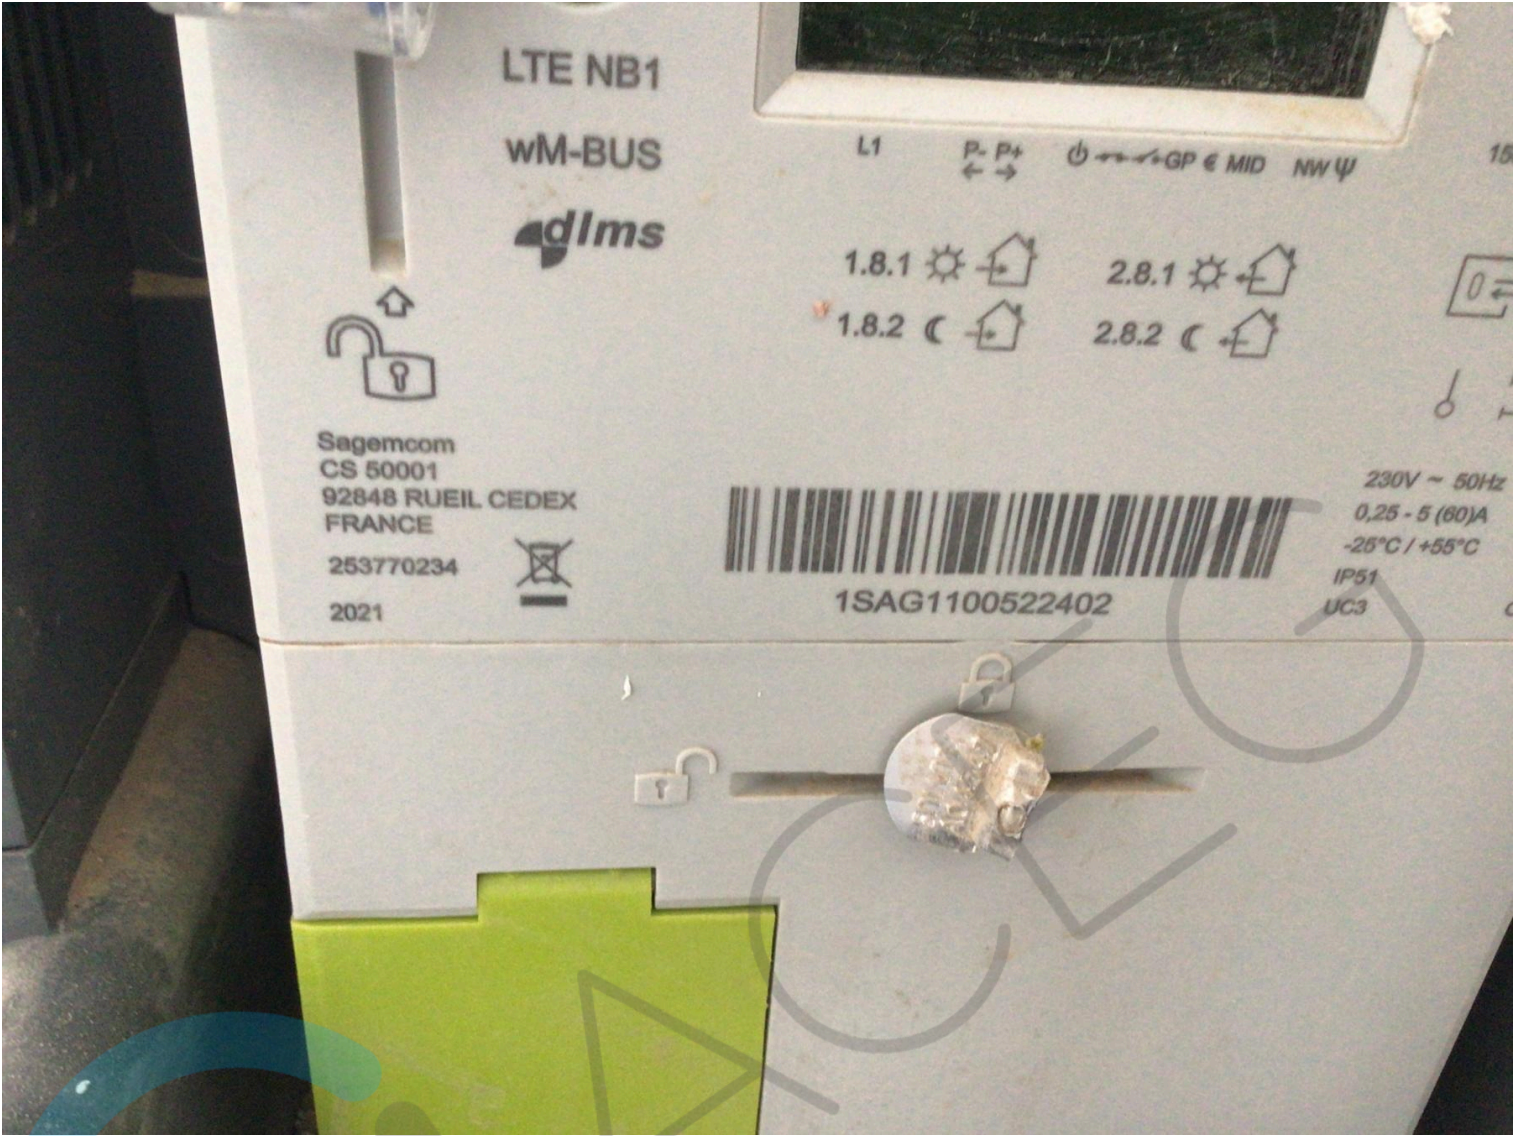



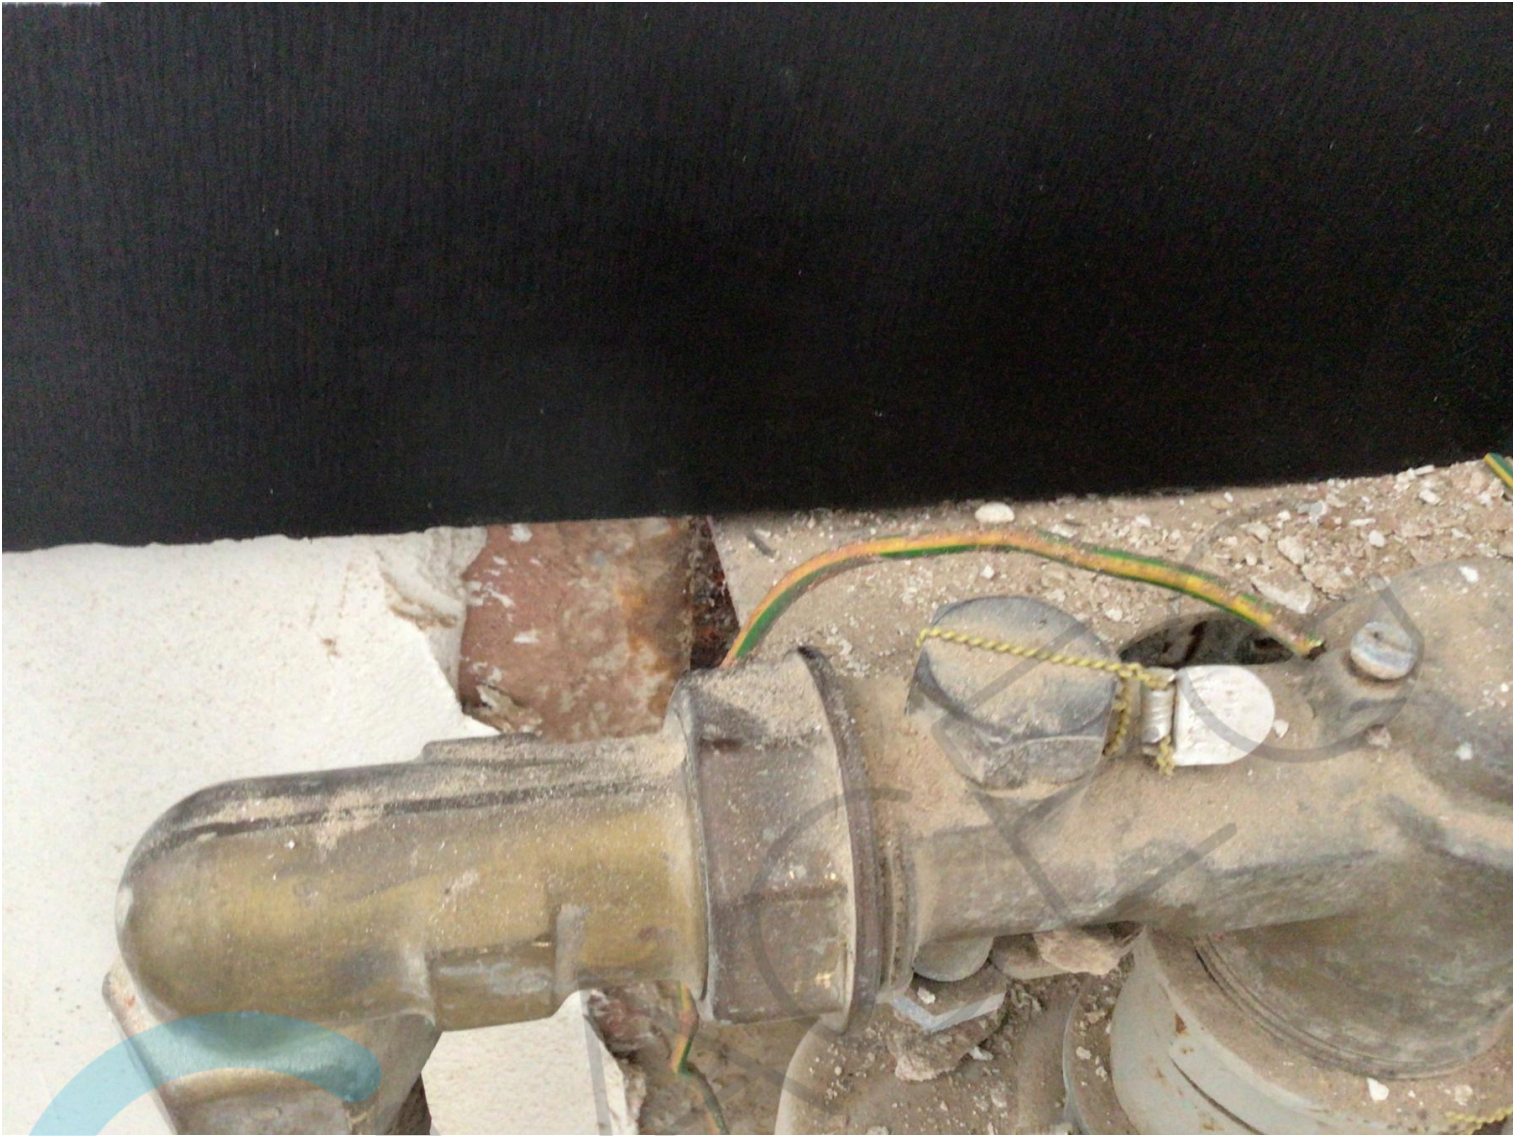

Datum: 31/03/2026 1/3
getekend met www.listrik.be

AANNEMER:
EIGENAAR:
KEURING:

AANNEMER:
EIGENAAR: IM ELECTRIC, Keizersdreef 6, 9940 Evergem

AANNEMER:
EIGENAAR: IM ELECTRIC, Keizersdreef 6, 9940 Evergem
KEURING: G&B BV, Gerrard Willemotlaan 29, 9030 Gent

Datum: 31/03/2026 2/3
getekend met www.listrik.be

Datum: 31/03/2026 1/1
getekend met www.listrik.be

DOSSIER ELEKTRISCHE INSTALLATIE

EIGENAAR

G&B BV
Gerrard Willemotlaan 29
9030 Gent
Datum: 31/03/2026

AANNEMER

IM ELECTRIC
Keizersdreef 6
9940 Evergem
BE1028335602
+32472981918
info@imelectric.be
Datum: 31/03/2026

KEURING

Datum: 31/4/2026
ACCG
Meyan 2
EAN code: [Handwritten signature]

Bijlagen....
Handtekening/Stempel

DOSSIER

SITUATIE-SCHEMA paginas:	3
EEN-DRAAD-SCHEMA paginas:	3
INSTALLATIE GEGEVENS paginas:	1
MATERIAAL LIJST paginas:	1
ZEKERINGKAST MARKERINGEN paginas:	2

Software naam

getekend met www.listrik.be



